Société : SA DEGAUCHY

DELAI : 3 MOIS HORS PERIODE DE PREPARATION

le 07 OCTOBRE 2009

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX CENTRE-BOURG

Code Prix

Planning Monchy Lagache

20 septembre 2010
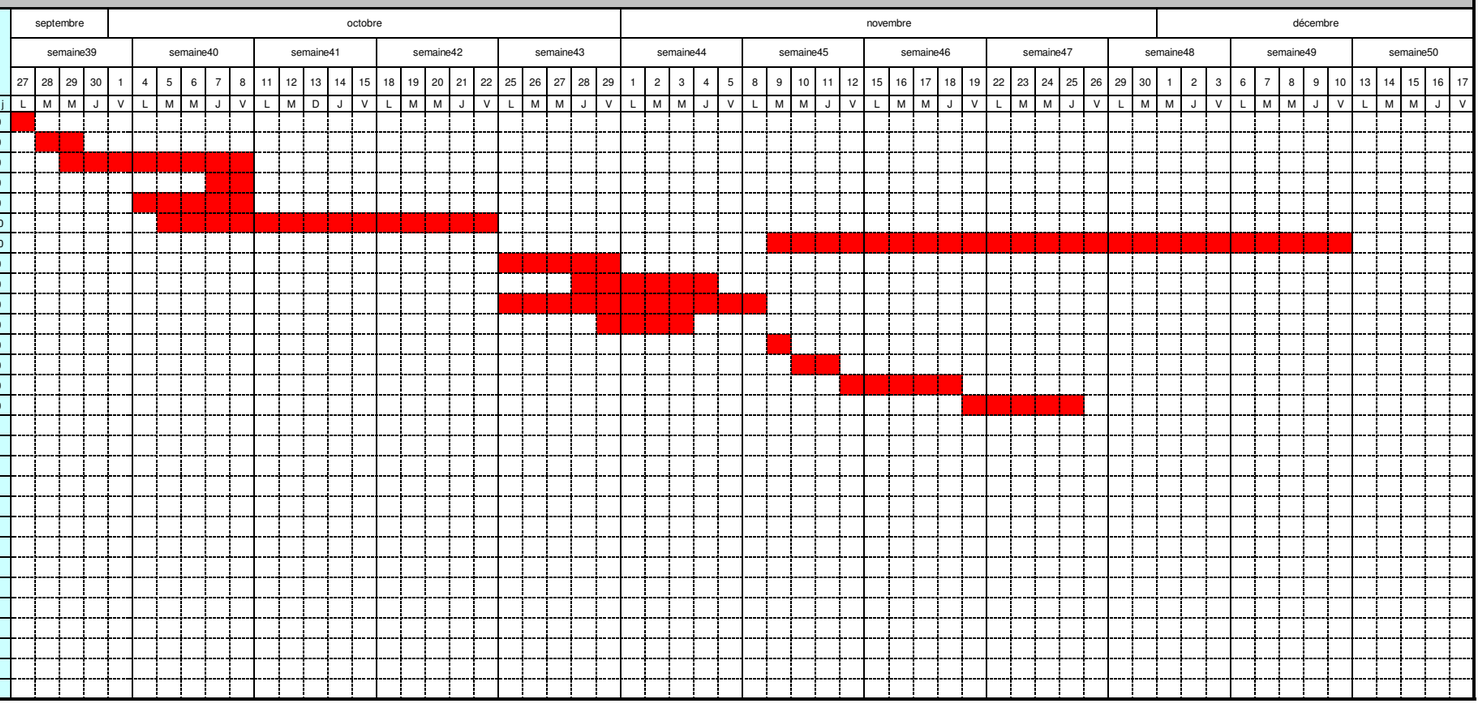
Désignation Tâche	Qté tot.	u	nbre j
Mise en place de la signalisation	1		1,00
Démolition mur de soutènement existant et terrasement pour le mur en L	60ml		1,00
Pose du nouveau mur de soutènement(dalle plus pose)	60ml		8,00
Reprise de l'escalier existant + hydrosablage du mur de soutènement	1ft		2,00
Terrassement des trottoirs et des voiries et des bordures+rabotage	1ft		5,00
Pose des bordures P1, T2 et des pavés de lignage	1440ml		10,00
Pose des pavé grés rustique (2 équipes)	821m²		32,00
Divers travaux d'électricité(INEO)	1ft		3,00
Mise a niveau d'ouvrage existant + pose canaiveaux	1ft		4,00
Mise en place du béton désactivé	1043m²		8,00
Mise en place de la GNT 0/31,5	850 t		4,00
Mise en place du sable stabilisé	246 m²		1,00
Fourniture et mise en œuvre de BB0/10	136t		2,00
Travaux d'assainissement (drain+noue+puisard)	60ml		5,00
Travaux de paysagement	1ft		5,00
